

CITTA' DI
VENEZIA




Sponsorizzazione restauro del balcone di Palazzo Ducale lato Piazzetta





Relazione a cura della Direzione LL.PP. del Comune di Venezia

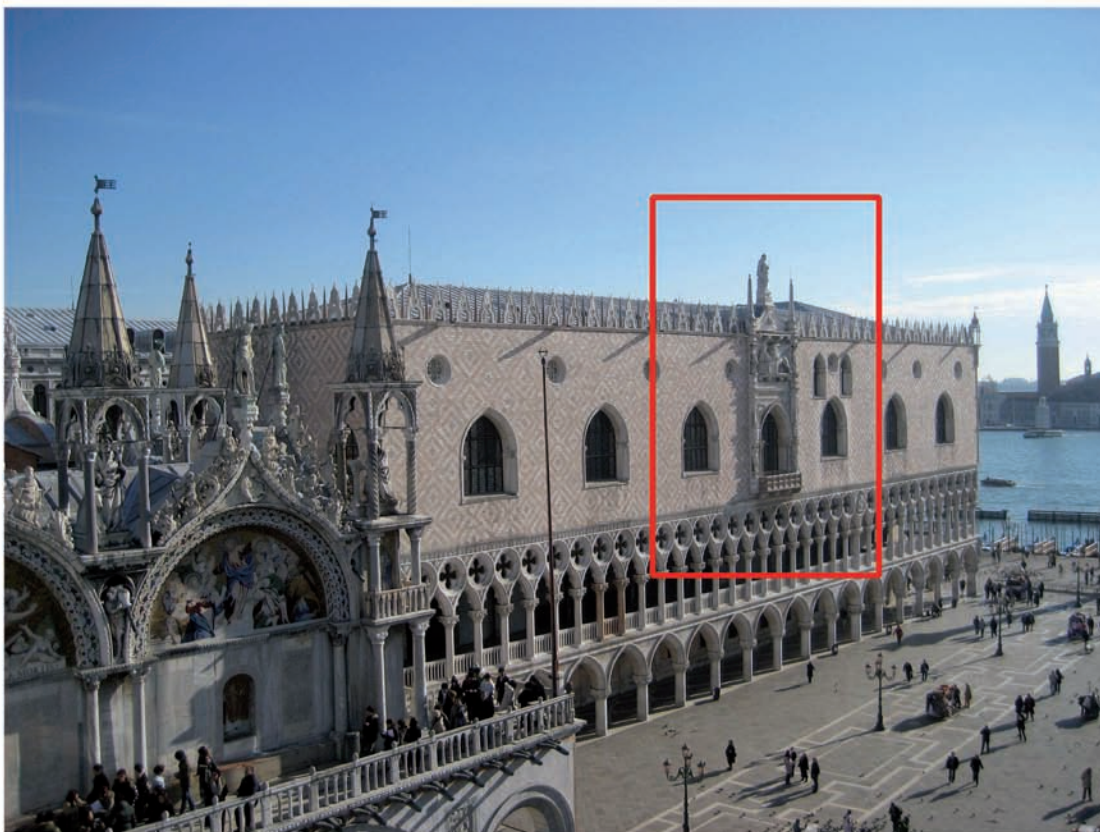

Nel corso degli ultimi anni palazzo Ducale è stato oggetto di indagini per verificare lo stato di salute delle facciate. Sono stati eseguiti una serie di monitoraggi che hanno interessato i diversi elementi che costituiscono questo complesso unico: murature, rivestimenti, gruppi scultorei, merli, pinnacoli etc e parte di essi sono già stati oggetto di interventi di messa in sicurezza o di restauro.

Durante il monitoraggio del balcone lato Piazzetta si sono anche qui evidenziate alcune criticità come presenza di fessurazioni, distacco di elementi lapidei, aggressione atmosferica, etc).

L'intervento che viene ora proposto prevede prima un'indagine più approfondita delle criticità e delle cause di quanto riscontrato in precedenza e una serie di interventi volti a ridare continuità alle sue componenti.


Si procederà con un'esame tattile del gruppo scultoreo posto in sommità, con l'ausilio di una struttura a sbalzo impostata sulla copertura di Palazzo Ducale e con la prestazione di scalatori-restauratori, per verificare lo stato di consistenza delle fessurazioni che sono state osservate con la indagine visiva procedendo alla rimozione di eventuali parti lapidee (se necessario) o alla sigillatura delle fessure, se possibile, nell'ottica della messa in sicurezza. A questo si aggiungerà la verifica della parte scultorea sottostante per verificarne la situazione prima della venuta dell'inverno.

In primavera, con le condizioni atmosferiche adeguate, si eseguiranno gli interventi di restauro del balcone e degli elementi scultorei procedendo alla realizzazione di un ponteggio da terra ed eseguendo la pulitura degli elementi lapidei, la sigillatura delle fessure, il consolidamento delle parti, la ricollocazione dei frammenti rimossi in precedenza nei vari monitoraggi, attualmente depositati all'interno di Palazzo Ducale, stesura di protettivo finale e quant'altro necessario nell'esecuzione dell'intervento di restauro.

CITTA' DI
VENEZIA



Mappatura degli interventi

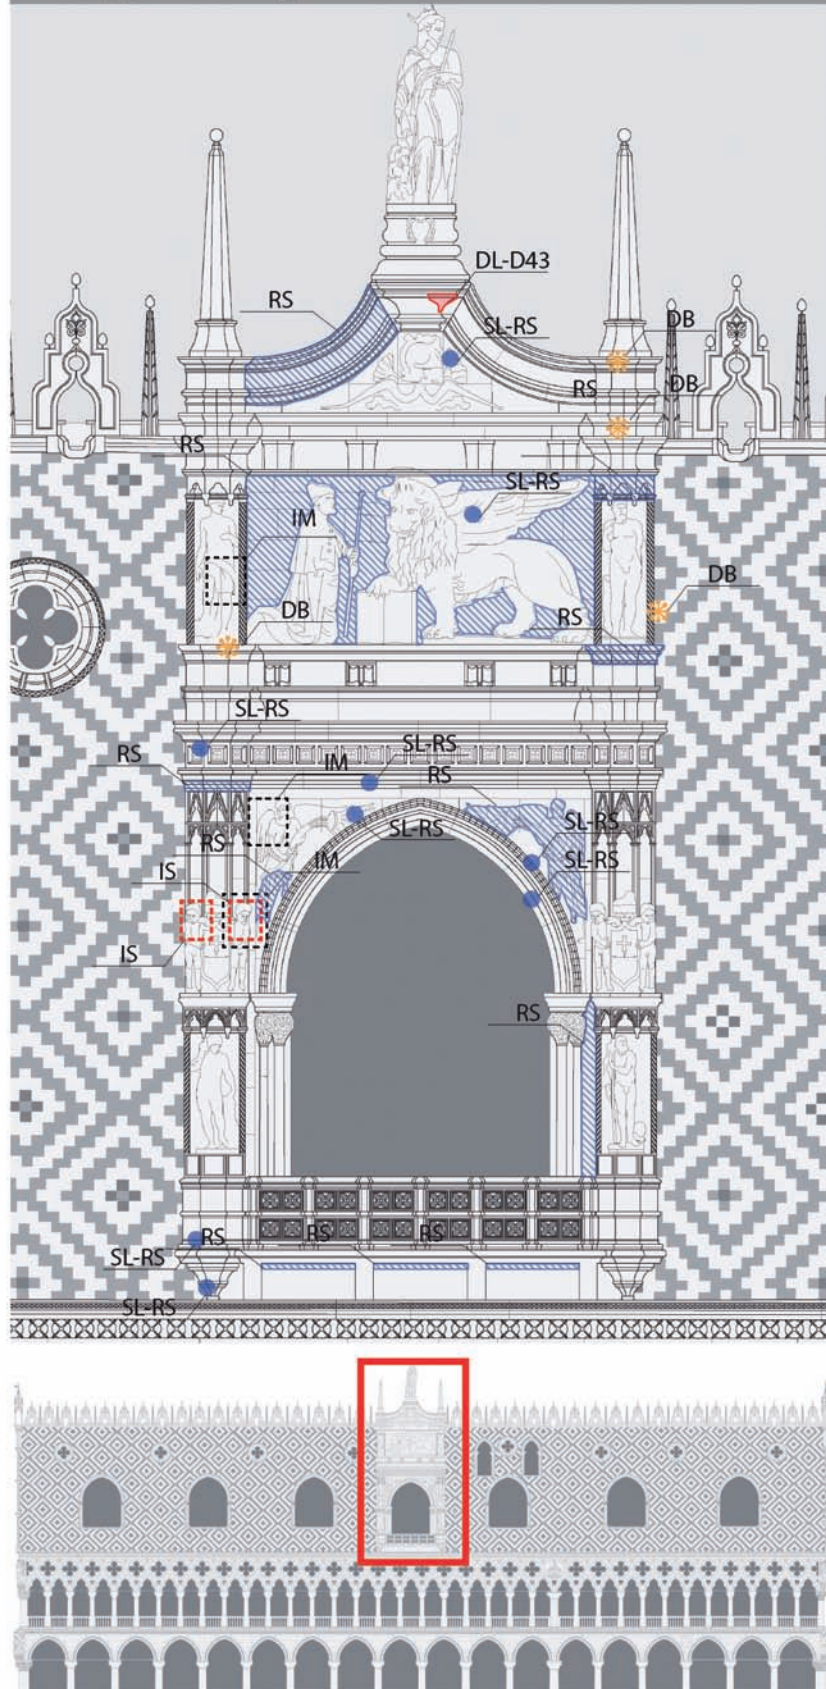




Porzione di basamento in fase di distacco



Distacco parziale di porzione lapidea del basamento

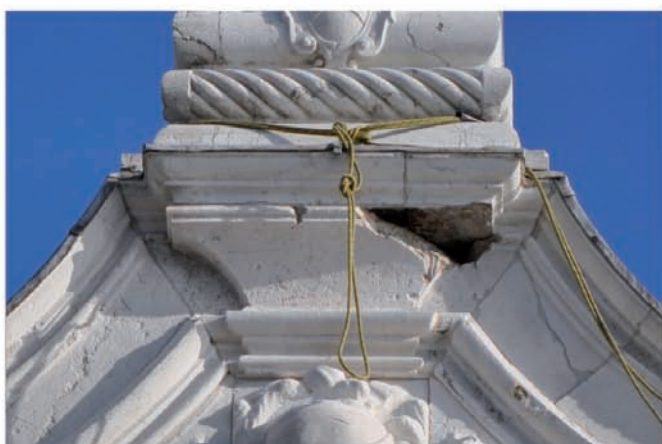

Area soggetta all'intervento di rimozione dei blocchi lapidei



Frammenti lapidei distaccati



Operazione di sigillatura delle lesioni di maggiore entità




Sigillatura eseguita alla base del collo di uno dei putti a sinistra della balconata

CITTA' DI
VENEZIA



Vista frontale

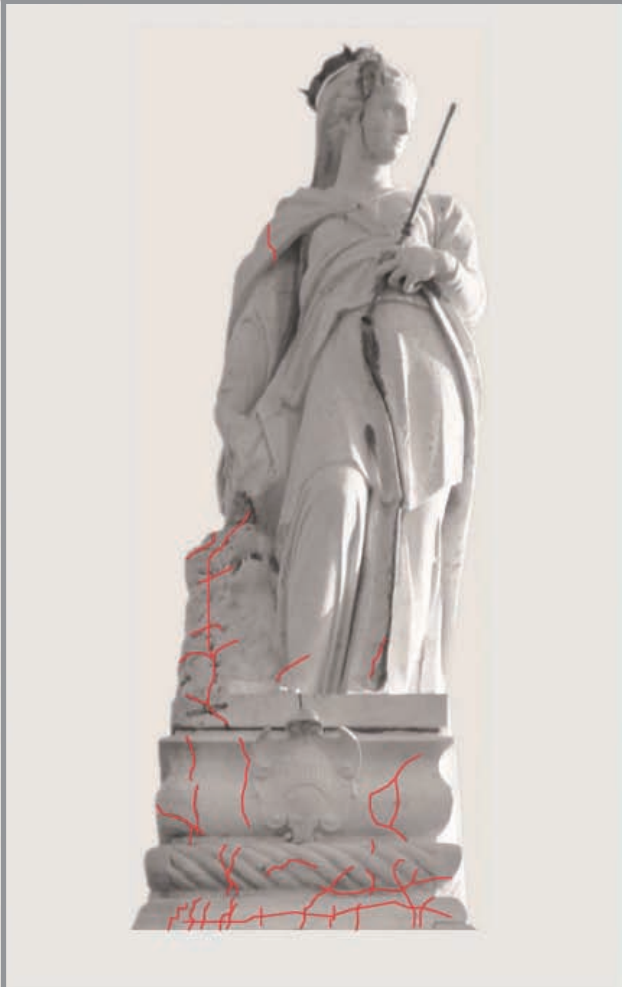

Vista retro

